

1. Toteuttajan nimi

Evijärvi-Seura ry (Y-tunnus 1084968-1)

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Pohjanmaan Järvisseudun Uittomieskämppä -hanke, hankkeen numero 12625

3. Yhteenveto hankkeesta

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa metsä- ja uittotyöt olivat monelle järviseutulaiselle tärkein ansionlähde. Ähtävänjokea pitkin ei ole uitettu ainoastaan Järvisseudun alueelta kaadetuja tukkeja, vaan puita on tuotu uittoon myös Suomenselän alueelta. Uitettujen tukkien määrän arvellaan olevan noin 5 miljoonaa. Tämä kertoo miten merkittävää toimintaa uitto oli seutukunnalle. Evijärvi on ollut keskeinen paikka uittotukkien koontipaikkana, ennen uiton jatkumista kohti rannikon suuria sahoja.

Uittokämpät ovat lähes kadonnutta kansanperinnettä. Vahvasta uittoperinteestä huolimatta Järvisseudulla ei ole säilynyt yhtäkään uittomieskämppää. Monet kämpät ovat lahonneet ja niihin liittyvät muistitiedot hävinneet. Evijärvi-Seura ry:n tavoitteena oli elvyttää uittoperinteeseen liittyvää kulttuuria rakentamalla Evijärven Jokisuunlahdelle uittomieskämppä, jonka suunnittelu tehtiin entisajan mallien mukaan. Kämpän rakentuminen on myös kansallisesti merkittävä kotiseututeko. Jatkossa kämpää ympäristöineen toimii teemaa kokoavana ja esittelevänä perinnealueena. Seura on tehnyt Evijärven kunnan kanssa 50 v vuokrasopimuksen alueesta.

Hankkeen toteutuksesta sekä kämpän rakentamisesta vastasi Evijärvi-Seura ry.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

a Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Leader Aisaparin Merkki Päällä -strategian yhtenä painopisteenä on paikallisidentiteetin vahvistaminen. Tämän tarkoituksena on vahvistaa ihmisten kokemaa paikallisuutta perinteen ja historian kautta. Tavoitteen mittarina toimii uudentyypiset tavat tuoda esille paikallista historiaa sekä perinnettä. Hankkeen toimenpitein luodaan uusi tapa tuoda esiin ja vahvistaa paikallisuutta tavalla, jota voidaan hyödyntää myös matkailun kehittämisessä. Toimenpitein kehitetään matkailuelinkeinojen ohella myös vapaa-ajan ja vakinaisten asukkaiden palveluita sekä viihtyisyyttä.

b hankkeen tavoitteet

Hankkeen konkreettinen tavoite oli rakentaa Evijärvelle Uittomieskämppä, joka on suunniteltu entisaikojen kämpän mallin mukaisesti. Uittomieskämppän rakentamisen tavoitteena on myös kasvattaa alueen väestön ja matkailijoiden tietoisuutta uittoperinteestä, tervankuljetuksesta sekä vesistöjen merkityksestä elinkeinojen kehittymiselle. Kämppä myös kunnioittaa uittomiesten tekemää työtä. Omalta osaltaan hanke kehittää seutukuntaa Luonon Omana Puistona, joka tarjoaa elämyksiä alueen historiasta, kulttuurista sekä luonnosta.

4.2. Toteutus

a) toimenpiteet ja aikataulu




Helmikuussa 2016 työ aloitettiin tontin raivaamisella. Puut kaadettiin ja tehtiin liittymä tontille.



Huhtikuussa työ jatkui rakennuksen pohjatöiden tekemisellä. Tontti salaojitettiin ja alueelle ajettiin soraa.




Toukokuussa tehtiin kämpän pohja ja valettiin anturat.

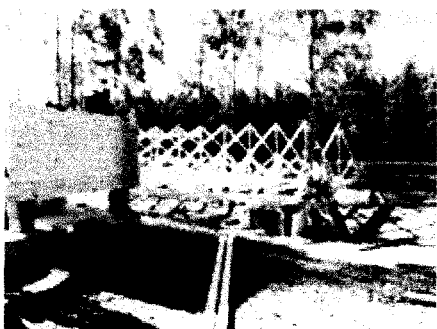

Kesäkuussa alkoi itse kämpän rakentaminen.



Syksyn 2016 ja talven 2017 aikana tehtiin erilaisia sisätöitä.

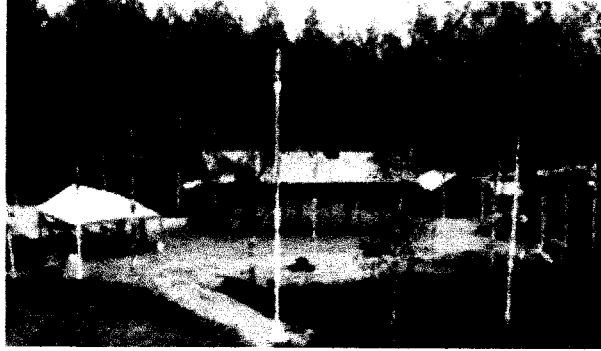

Uittokämpän vihkiäisjuhlat pidettiin 9.7.2017.

c) resurssit

Hankkeen hallinnoijana toimi Evijärvi-Seura ry. Seura on vastuussa myös hankkeen taloudesta. Rahoituksen hankkeeseen myönsi Aisapari ry. Muuta tukea hankkeen toteuttamiseen ei ole saatu. Investoinnin toteuttamiseen, erityisosaamista edellyttävien asioiden hankinta ostettiin ulkopuolisilta toimijoilta. Rakentamistyöhön merkittävimmän panoksen antoivat seuran hallituksen jäsenet.

d) toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteutus- ja rahoitusvastuu oli Evijärvi-Seura ry:llä ja hanketta johti puheenjohtaja Heikki Valijoki. Puheenjohtaja vastasi rakentamiseen liittyvien tarjousten pyytämisestä ja vertailemisesta sekä huolehtimisesta hankkeen etenemisestä suunnitellussa aikataulussa. Rakentamiseen liittyviä erityistä osaamista edellyttävät tehtävät hankittiin ostopalveluin. Tällaisia töitä olivat mm. kämpän rungon ostaminen rakennusvalmiina sekä kämpän katon päreet.

Rakentamiseen liittyvä työ suoritettiin talkootyönä seuran hallituksen aktiivisten jäsenten sekä muutamien rakennusammattilaisen toimesta.

e) kustannukset ja rahoitus

Hanke on toteutunut kustannusarvion mukaisesti

Kustannukset	Hyväksytty kustannusarvio	Toteutuneet kustannukset
Rakentaminen, saatu tuki	40 000,00 €	40 000,00 €
Vastikkeeton työ	44 070,00 €	44 070,00 €
YHTEENSÄ	84 070,00€	84 070,00€

f) raportit ja seuranta

Hankkeen käytännön edistymistä sekä budjettia on seurattu Evijärvi-Seura ry:n hallituksessa. Hankkeen käytännöntöistä vastannut Heikki Valijoki on kokouksissa tuonut esille rakentumisen aikataulua ja toteutuksen tilaa.

g) toteutusoletukset ja riskit

Uittomieskämpä on rakentunut suunnitellun aikataulun mukaisesti, eikä rakentamisvaiheessa ole ilmennyt ongelmia. Rakentaminen on lisännyt kiinnostusta uittiperinnettä kohtaan Järviseudulla. Kämpällä on vierailut lukuisia ryhmiä tutustumassa rakennukseen ja uittoperinteeseen. Kämpän avajaisissa oli mukana mm. Suomen Uittiperinneyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen toimesta kämpä tulee saamaan osakseen myös kansallista julkisuutta.

Evijärvi-Seura ry:llä on suunnitelmia alueen edelleen kehittämistä, joten alueen käytettävyyteen tullaan panostamaan myös jatkossa. Kehittämisellä lisätään myös paikan tunnettavuutta sekä kiinnostavuutta.

4.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat olleet ostopalvelujen ja tavaroiden toimittajat. Evijärven kunta on lupaviranomaisena ollut merkittävä kumppani projektin toteutumisessa.

4.4 tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena on Evijärvelle rakennettu perinteinen Uittomieskämppä. Kämppä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia alueen virkistys- ja matkailutoiminnan kehittämiseen, mutta myös uittoteeman hyödyntämiseen laajemminkin. Vastaavia uittoperinnealueita ei Suomessa ole muualla. Investoinnin avulla on nostettu alueen asukkaiden parempaan tietoisuuteen uittotoiminnan merkitys Järvisseudulla.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Uittomieskämppä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää edelleen uittoteemaa. Evijärvi-Seura ry:llä onkin jo suunnitelmia alueen jatkokehittämiseksi ja tätä kautta kiinnostavuuden lisäämisessä. Ideoiden eteneminen edellyttää ainoastaan rahoituskanavien löytämisen toteutuksen tekemiseen.

Järvisseudun alueella on aloitettu matkailun Master Plan suunnitelman teko. Jatkossa tuleekin huomioida kämpän ja uittoperinteen mahdollisuudet virkistys- ja matkailutoimintojen kehittämisessä. Kämppä tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäristön toteuttaa oleellisesti alueen kulttuuriin ja historiaan liittyviä tapahtumia sekä kokous- ja virkistyspäiviä.



Heikki Valijoki
puheenjohtaja
Evijärvi-Seura ry
